



घ्याङ्गलेख गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली



बैसाख सम्मको मासिक प्रगति प्रतिवेदन
पूर्वाधार शाखा

मिति :- २०८०/०१/०३

घरनक्सा सम्बन्धि विवरण

- गाउँपालिका भित्रको सडक सार्वजनिक गराउने सम्बन्धि जानकारी सबै वार्डमा
- घर नक्सा पास सम्बन्धि सूचना पटक पटक सार्वजनिक गरेको
- नक्सा पासको लागि परेको निवेदन – ४ मध्ये ३ इन्जिनियर बाट स्वीकृत भइ राजस्व समेत तिरेको
- नक्सा पास प्रक्रियामा नआएको तर मौखिक जानकारीमा आएको – १०
- भवन मापदण्ड आ.व. २०८०/०८१ बाट संसोधन हुने जानकारी गराएको
- ३ भवन नियमित र १ भवन मापदण्ड अनुसार पास प्रक्रिया

ઠેકકા સમ્બન્ધિ વિવરણ

સિ.ન	વિવરણ	ઠેકકા ન.	સમ્જૌતા રકમ	પ્રગતિ
૧	રામપુર પાખુરે રામભેડે હુદૈ કાગલિડ સમ્મ સડક	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/4/078/079	૧૦,૩૭,૧૫૩.૫૦	૬૦.૩૬%
૨	Ward no 5 Office Building Construction (Multi-Year)	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/5/077/078		૭૫% અન્દાજિ
૩	ચન્દનપુર-સલ્લે-કેરાબારી-ગૈરી-ભૈસે-વસ્તીપુર-સાતદોબાટો સમ્મ સડક નિર્માણ	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/02/079-80		૩૦ %
૪	Construction of Administrative Building	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/12/078/079		કામ સુરુવાત, જગ ખની ઇસ્થગિત
૫	Construction of Safe House Building			૭૫% અન્દાજિ
૬	સોલા ભન્જ્યાંગ ચિલાઝને સાતદોબાટો સડક ઇસ્તર ઉન્નતિ			સમ્પન્ન
૭	આમાલે થાલાગાઝ સડક ઇસ્તર ઉન્નતિ			સમ્પન્ન
૮	માતોખાની ઝો.પુ.			કામ ગર્દે ૫૦%
૯	પિપલબોટ હાયુટાર ઝો.પુ.			કામ ગર્દે ૧૦%

वार्ड न. १ को योजना विवरण

वार्ड नं १ को योजना संख्या अनुसारको विवरण			
योजना विवरण	संख्या	प्रतिसत	कैफियत
जम्मा योजना	18		
इस्टिमेट सम्झौता योजना	10	55.56%	
काम सम्पन्न भयको	8	80.00%	सम्झौता भयको मदधे
काम हुदै गरेको योजना	3	30.00%	सम्झौता भयको मदधे
सम्झौता गरि काम नगरेको	0		
सम्झौता नगरेको योजना	8		सम्झौता गरि काम गर्ने

रकम अनुसारको विवरण		
विवरण	रकम	प्रतिसत
वार्ड नं १ को वार्ड / पालिका को जम्मा रकम रु	12,000,000.00 एक करोड बिस लाख	
वार्ड नं १ को वार्ड / पालिका को सम्झौता भयको रकम रु	4,400,000.00 चौवालिस लाख	37.61%
वार्ड नं १ को वार्ड / पालिका को कार्यसम्पन्न भयको रकम रु	33,00,000.00 तेत्तिस लाख	61.36%
वार्ड नं १ तर्फ को जम्मा रकम रु	5,000,000.00 पचास लाख	जम्मा -1,20,00,000.00 एक करोड बिस लाख
वार्ड नं १ मा पालिका तर्फको जम्मा रकम	7,000,000.00 सत्तरी लाख	

वार्ड न. २ को योजना विवरण

वार्ड नं २ को योजना संख्या अनुसारको विवरण					
योजना विवरण	संख्या	प्रतिसत	कैफियत		
जम्मा योजना	18				
इस्टिमेट सम्झौता योजना	13	72.22%			
काम सम्पन्न भयको	8	61.54%	सम्झौता भयको मदधे		
काम हुदै गरेको योजना	4	30.77%	सम्झौता भयको मदधे		
सम्झौता नगरेको योजना	5		२ ओटा योजना काम नगर्ने - आ.स्रोत		
वार्ड तर्फको जम्मा योजना	10				
वार्ड तर्फको सम्झौता नगरेको योजना	2				
वार्ड नं २ मा पालिका तर्फको जम्मा योजना	8				
वार्ड नं २ मा पालिका तर्फको सम्झौता नगरेको योजना	2				
प्रदेश तर्फको योजना	2		१ सम्झौता भयको ,१सर्वे भयको		

रकम अनुसारको विवरण		
विवरण	रकम	प्रतिसत
वार्ड नं २ को वार्ड / पालिका को जम्मा रकम रु	13,350,000.00 एक करोड तेत्तिस लाख पचास हजार	
वार्ड नं २ को वार्ड / पालिका को सम्झौता भयको रकम रु	11,400,000.00 एक करोड चौध लाख	85.39%
वार्ड नं २ को वार्ड / पालिका को कार्यसम्पन्न भयको रकम रु	76,50,000.00 छयहत्तर लाख पचास हजार	57.02%
वार्ड नं २ तर्फ को जम्मा रकम रु	5,000,000.00 पचास लाख	जम्मा -2,08,50,000.00 दुइकरोड आठ लाख पचास हजार
वार्ड नं २ मा पालिका तर्फको जम्मा रकम	8,350,000.00 तिरासी लाख पचास हजार	
प्रदेश तर्फको जम्मा रकम	7,500,000.00 पचहत्तर लाख	

वार्ड न. ३ को योजना विवरण

वार्ड नं ३ को योजना संख्या अनुसारको विवरण				
योजना विवरण	संख्या	प्रतिसत	कैफियत	
जम्मा योजना	26			
इस्टमेट सम्झौता योजना	21	80.77%		
काम सम्पन्न भयको	16	76.19%	सम्झौता भयको मदधे	
काम हुदै गरेको योजना	1	4.76%	सम्झौता भयको मदधे	
सम्झौता गरि काम नगरेको	4			
सम्झौता नगरेको योजना	5		ओटा योजना काम गर्ने - आ.स्रोत ले ढिलाई	
वार्ड तर्फको जम्मा योजना	24			
वार्ड नं ३ मा पालिका तर्फको जम्मा योजना	2			

रकम अनुसारको विवरण

विवरण	रकम	प्रतिसत
वार्ड नं ३ को वार्ड / पालिका को जम्मा रकम रु	6,919,000.00 उन्नन सत्तरिलाख उन्नाइस हजार	
वार्ड नं ३ को वार्ड / पालिका को सम्झौता भयको रकम रु	5,640,000.00 छपन्नलाख चालिस हजार	81.51%
वार्ड नं ३ को वार्ड / पालिका को कार्यसम्पन्न भयको रकम रु	36,44,000.00 छत्तिस लाख चौवालिस हजार	47.87%
वार्ड नं ३ तर्फ को जम्मा रकम रु	5,000,000.00 पचास लाख	जम्मा -69,19,000.00 उन्नन सत्तरिलाख उन्नाइस हजार
वार्ड नं ३ मा पालिका तर्फको जम्मा रकम	1,919,000.00 उन्नाइस लाख उन्नाइस हजार	

वार्ड न. ४ को योजना विवरण

वार्ड नं ४ को योजना संख्या अनुसारको विवरण

योजना विवरण	संख्या	प्रतिसत	कैफियत		
जम्मा योजना	24				
इस्टमेट सम्झौता योजना	21	87.50%			
काम सम्पन्न भयको	11	52.38%	सम्झौता भयको मदधे		
काम हुदै गरेको योजना	7	38.10%	सम्झौता भयको मदधे		
सम्झौता गरि काम नगरेको	3		काम गर्न अटेर गरेको		
सम्झौता नगरेको योजना	2				
वार्ड तर्फको जम्मा योजना	14				
वार्ड नं ४ मा पालिका तर्फको जम्मा योजना	10				

रकम अनुसारको विवरण

विवरण	रकम	प्रतिसत
वार्ड नं ४ को वार्ड / पालिका को जम्मा रकम रु	9,875,000.00 अन्ठानब्बे लाख पचहत्तरहजार	
वार्ड नं ४ को वार्ड / पालिका को सम्झौता भयको रकम रु	9,525,000.00 पन्चानब्बे लाख पच्चिस हजार	96.46%
वार्ड नं ४ को वार्ड / पालिका को कार्यसम्पन्न भयको रकम रु	33,25,000.00 तेत्तिस लाख पच्चिस हजार	34.91%
वार्ड नं ३ तर्फ को जम्मा रकम रु	5,000,000.00 पचास लाख	जम्मा -98,75,000.00 अन्ठानब्बे लाख पचहत्तरहजार
वार्ड नं ४ मा पालिका तर्फको जम्मा रकम	4,875,000.00 अड्चालिस लाख पचहत्तर हजार	

वार्ड न. ५ को योजना विवरण

वार्ड नं ५ को योजना संख्या अनुसारको विवरण


योजना विवरण	संख्या	प्रतिसत	कैफियत		
जम्मा योजना	27				
इस्टमेट सम्झौता योजना	25	100.00%	जम्मा योजना मदधे		
काम सम्पन्न भयको	25	91.30%	सम्झौता भयको मदधे		
काम हुदै गरेको योजना	0	4.35%	करिब ७०% काम सक्कियाको		
सम्झौता गरि काम नगरेको योजना	1	4 %	आन्तरिक स्रोतको कारण रोक्किको		
सम्झौता नगरेको योजना	1		काम नगर्ने		
वार्ड तर्फको जम्मा योजना	13				
वार्ड तर्फको सम्झौता नगरेको योजना	0				
वार्ड तर्फको सम्झौता गरि काम नगरेको योजना	0				
वार्ड नं ५ मा पालिका तर्फको जम्मा योजना	14				
वार्ड नं ५ मा पालिका तर्फको सम्झौता नगरेको योजना	1				
वार्ड नं ५ मा पालिका तर्फको सम्झौता गरि काम नगरेको योजना	1				
प्रदेश तर्फको योजना	1	100.00%	कार्य सम्पन्न		

रकम अनुसारको विवरण


विवरण	रकम	प्रतिसत
वार्ड नं ५ को वार्ड / पालिका को जम्मा रकम रु	11,500,000.00 एक करोड पन्द्र लाख	
वार्ड नं ५ को वार्ड / पालिका को सम्झौता भयको रकम रु	10,800,000.00 एक करोड आठ लाख	93.91% जम्मा रकम मध्ये
वार्ड नं ५ को वार्ड / पालिका को कार्यसम्पन्न भयको रकम रु	1,08,00,000.00 एक करोड आठ लाख	100 % सम्झौता भयको रकम मध्ये
वार्ड नं ५ तर्फ को जम्मा रकम रु	5,000,000.00 पचास लाख	जम्मा -1,40,00,000.00 (एक करोड चालिसलाख)
वार्ड नं ५ मा पालिका तर्फको जम्मा रकम	6,500,000.00 पैंसठ्ठी लाख	
प्रदेश तर्फको जम्मा रकम	2,500,000.00 पच्चिस लाख	

गाउँपालिका भरिको सम्पन्न योजनाको अवस्था

योजना भौतिक सम्पन्न प्रगति %

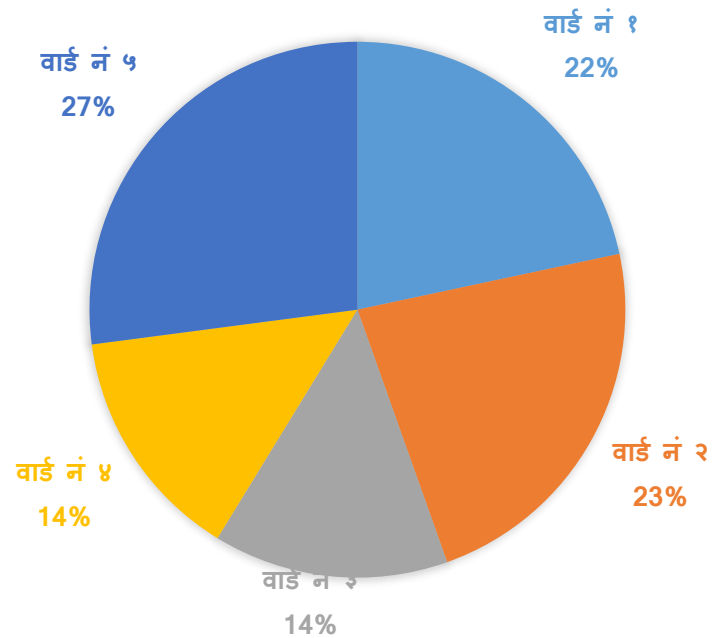

योजना वित्तीय सम्पन्न प्रगति %

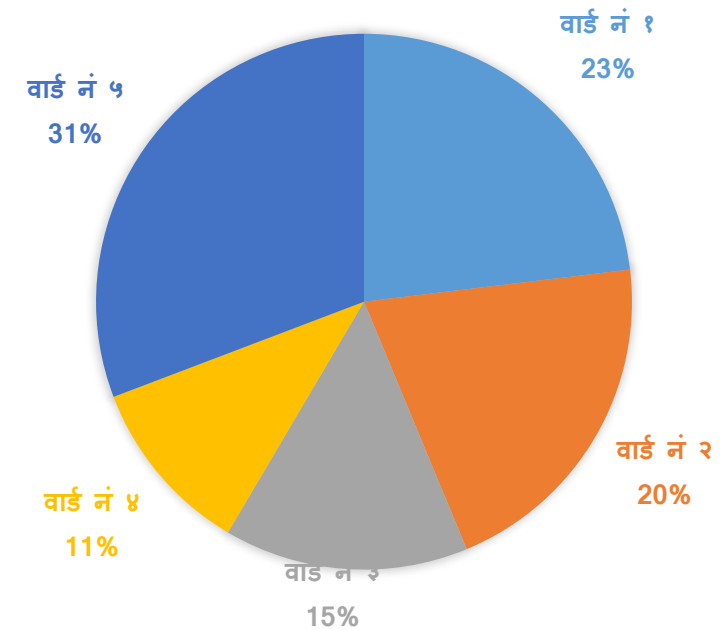

पूर्वाधार शाखामा भयका थप नयाँ काम

- योजनामा इस्टिमेट सहित Design Drawing
- योजना भुक्तानी कागज पत्र मा पारदर्शिता
- प्रतेक वार्ड मा योजना अभिलेख प्रगति सहित
- कन्टेन्जेन्सी खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण

कार्य सम्पादन गर्न आइपरेका समस्या

- कार्यसम्बन्धि तालिमको कमि
- सवारी साधन मा समस्या
- फोन नेटवर्क मा समस्या
- सुरक्षा सामाग्री (बुट,रेनकोट,Safety Leg Pad) ल्याउने प्रक्रिया
- कार्य सम्पादनका सामाग्री को कमि (Colour Printer,Tape,Abni Level,GPS)
- पूर्वाधार शाखा मा Internet नभएको
- प्राविधिक फाँटका कर्मचारीमा जिम्बेवार पूर्ण बहन नभएको

कार्य सम्पादन गर्न आइपरेका चुनौती

- भाषाको सम्बन्धि
- भुगोल सम्बन्धि
- कच्ची सडकको अवस्था
- मोटर साइकलको अवस्था
- कर्मचारी समन्वयको कमि
- कर्मचारी गोपनियताको कमि

फोटोहरु



कर्मचारी र जनप्रतिनिधि रोड नाप्दै



वार्सादको समयमा रोडको अवस्था



रोडको सबै गर्न मोटरसाइकल बाट जाने बाटोको अवस्था



फिल्ड हिंडने क्रममा मोटरसाइकलबिग्रिने समस्या



थोरै लगानीमा भयका उत्कृष्ट केहि कामहरु



थोरै लगानीमा भयका उत्कृष्ट केहि कामहरु



चन्दनपुर सातदोबाटो सडक निर्माण प्रगति



सुरक्षाको सामान बिना बिधुत पोलमा काम गर्दै

मेरो प्रस्तुती हेरी र सुनिदिनु भयको मा यहाँहरु सम्पूर्णमा हार्दिक

धन्यवाद !!!!

पूर्वाधार शाखा
