



घ्याङ्गलेख गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली



बैशाखा अन्तिम सम्मको मासिक प्रगति प्रतिवेदन
पूर्वाधार शाखा
मिति :- २०८०/०२/०३

ઘરનક્સા સમ્બન્ધિ વિવરણ

વિવરણ	ગત મહિના	યસ મહિના	હાલસમ્મ	કૈફિયત
સડક બાટો સાર્બજનિક સમ્બન્ધિ પહલ	૨	૧	૩	૫ વડામા
ઘર નક્સા નિયમિત તથા અભિલેખીકરણ ,નયાં નિર્માણ દર્તા	૪	૧	૫	
નયાં ઘર નક્સા પાસ ગર્ન જાનકારી	૧	૧	૨	૫ વડામા
ભવન માપદણ્ડ ઓરેન્ટેસન હેટૌડા	૧	૦	૧	

ठेक्का सम्बन्धि विवरण

सि.न	विवरण	ठेक्का न.	सम्झौता रकम	प्रगति
१	रामपुर पाखुरे रामभेडे हुँदै कागलिङ सम्म सडक	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/4/078/079	९०,३७,९५३.५०	आ.- ६०.३६%, भौतिक- ७०%अन्दाजी
२	Ward no 5 Office Building Construction (Multi-Year)	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/5/077/078	४२,५०,५९९.२३	आ.-५१.९६% भौतिक -८५% अन्दाजी
३	चन्दनपुर-सल्ले-केराबारी-गैरी-भैसे-वस्तीपुर-सातदोबाटो सम्म सडक निर्माण	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/02/079-80	१,९१,२९,७७२.०५	आ.-५४.७७% भौतिक-६५% अन्दाजी
४	Construction of Administrative Building	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/12/078/079	५,७७,८९,०३७.१३	डिजाइन परिवर्तन
५	Construction of Safe House Building	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/6/078/079	३८,९०,४६९.०६	आ.- ७०.६% भौतिक - ८०%
६	सोला भन्ज्यांग चिलाउने सातदोबाटो सडक इस्तर उन्नति			सम्पन्न
७	आमाले थालागाउँ सडक इस्तर उन्नति			सम्पन्न
८	माटोखानी झो.पु.	ठेक्का बाट सामान खरिद प्रक्रिया सकी समिति बाट निर्माण कार्य हुँदै		काम गर्दै ५०% अन्दाजी
९	पिपलबोट हायुटार झो.पु.	E-Bid बाट कुनै ठेक्का नपरि सिल कोटेसन मार्फत प्रक्रिया बढेको		काम गर्दै २०% अन्दाजी


वडा न. १ को योजना विवरण

वडा नं १ को योजना संख्या अनुसारको विवरण					
योजना विवरण	संख्या	प्रतिसत	कैफियत		
जम्मा योजना	18				
इस्टमेट सम्झौता योजना	16 थप - 8	55.56%			
काम सम्पन्न भयको	10 थप -2	80.00%			
काम हुदै गरेको योजना	3	30.00%			
सम्झौता गरि काम नगरेको					
सम्झौता नगरेको योजना	2				

रकम अनुसारको विवरण

विवरण	रकम	प्रतिसत
वडा नं १ को वडा / पालिका को जम्मा रकम रु	1,20,00,000.00 एक करोड बिस लाख	
वडा नं १ को वडा / पालिका को सम्झौता भयको रकम रु	1,05,00,000.00 एक करोड पांच लाख	थप – 61,00,000 89.74%
वडा नं १ को वडा / पालिका को कार्यसम्पन्न भयको रकम रु	42,00,000.00 बयालीस लाख	थप -9,00,000 35.90%
वडा नं १ तर्फ को जम्मा रकम रु	50,00,000.00 पचास लाख	जम्मा -1,20,00,000.00 एक करोड बिस लाख
वडा नं १ मा पालिका तर्फको जम्मा रकम	7,000,000.00 सत्तरी लाख	

योजना को भौतिक प्रगति - वडा नं १

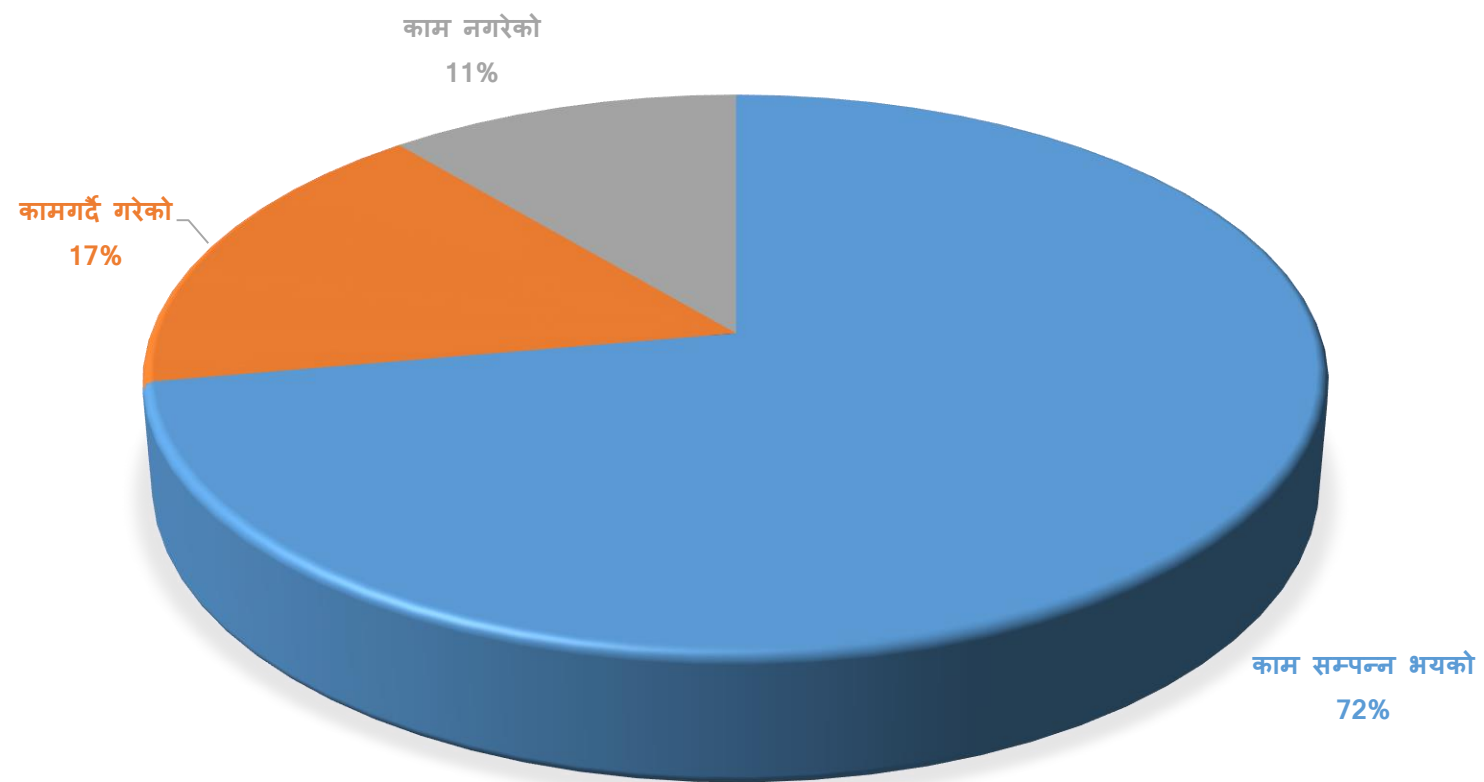


वडा नं. २ को योजना विवरण

वडा नं २ को योजना संख्या अनुसारको विवरण					
योजना विवरण	संख्या	प्रतिसत	कैफियत		
जम्मा योजना	18				
इस्टमेट सम्झौता योजना	16 थप 3	88.89%			
काम सम्पन्न भयको	12 थप 1	75%			
काम हुदै गरेको योजना	4	25%			
सम्झौता नगरेको योजना	0				
वार्ड तर्फको जम्मा योजना	10				
वडा तर्फको सम्झौता नगरेको योजना	0				
वडा नं २ मा पालिका तर्फको जम्मा योजना	8				
वडा नं २ मा पालिका तर्फको सम्झौता नगरेको योजना	2				
प्रदेश तर्फको योजना	2	सडक को काम आधा भैसक्यो	खानेपानी को ट्यांकी निर्माण गर्ने		

रकम अनुसारको विवरण

विवरण	रकम	प्रतिसत
वडा नं २ को वडा / पालिका को जम्मा रकम रु	13,350,000.00 एक करोड तेत्तिस लाख पचास हजार	
वडा नं २ को वडा / पालिका को सम्झौता भयको रकम रु	1,17,50,000.00 एक करोड सत्र लाख पचास हजार	थप – 3,50,000 88.01%
वडा नं २ को वडा / पालिका को कार्यसम्पन्न भयको रकम रु	1,06,00,000.00 एक करोड छ लाख	थप -29,50,000 79.40%
वडा नं २ तर्फ को जम्मा रकम रु	5,000,000.00 पचास लाख	जम्मा -2,08,50,000.00 दुइकरोड आठ लाख पचास हजार
वडा नं २ मा पालिका तर्फको जम्मा रकम	8,350,000.00 तिरासी लाख पचास हजार	
प्रदेश तर्फको जम्मा रकम	7,500,000.00 पचहत्तर लाख	

योजना को भौतिक प्रगति - वडा नं २

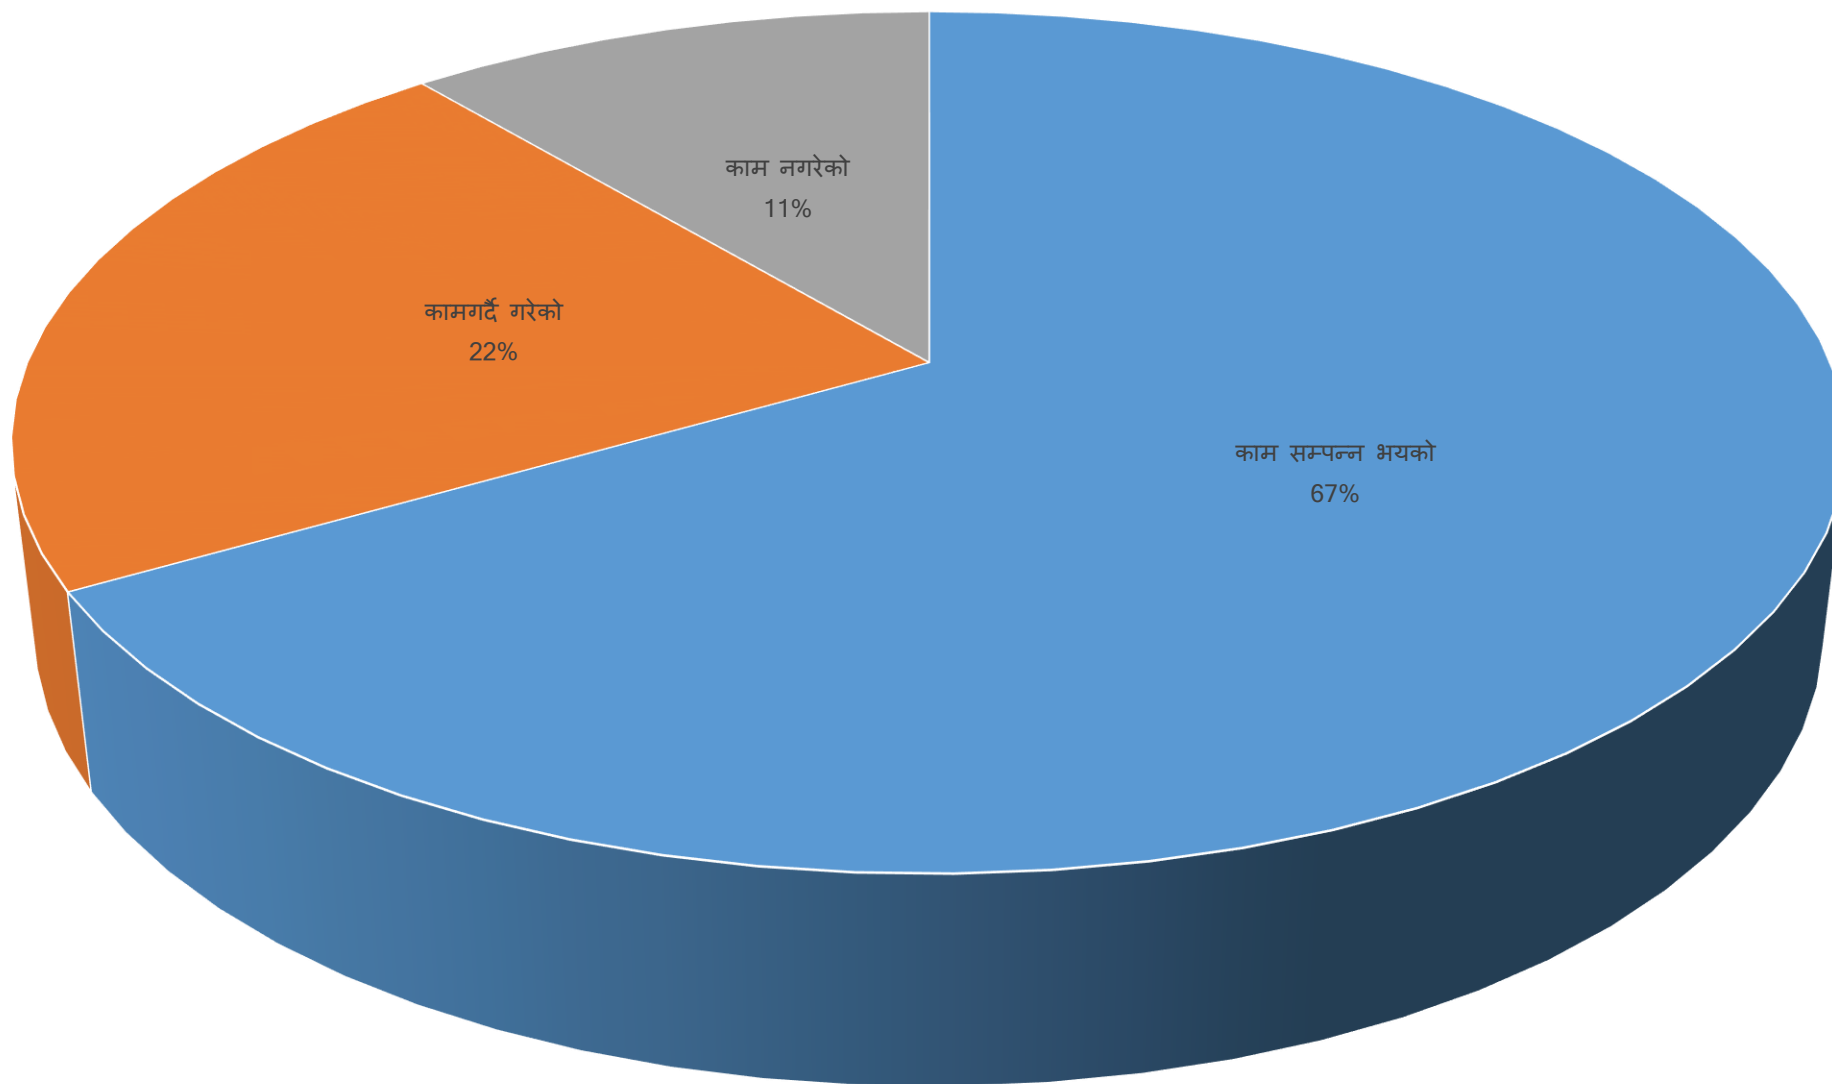


वडा नं. ३ को योजना विवरण

वडा नं ३ को योजना संख्या अनुसारको विवरण				
योजना विवरण	संख्या	प्रतिसत	कैफियत	
जम्मा योजना	26			
इस्टिमेट सम्झौता योजना	24 थप -3	92.31%		
काम सम्पन्न भयको	16	66.67%	सम्झौता भयको मदधे	
काम हुदै गरेको योजना	8 थप - 7	33.33%	सम्झौता भयको मदधे	
सम्झौता गरि काम नगरेको	0 पहिला 4			
सम्झौता नगरेको योजना	2		काम गर्ने - आ.स्रोत ले ढिलाई	
वडा तर्फको जम्मा योजना	24			
वडा नं ३ मा पालिका तर्फको जम्मा योजना	2			

रकम अनुसारको विवरण

विवरण	रकम	थप प्रगति/प्रतिसत
वडा नं ३ को वडा / पालिका को जम्मा रकम रु	6,919,000.00 उन्नन सत्तरिलाख उन्नाइस हजार	
वडा नं ३ को वडा / पालिका को सम्झौता भयको रकम रु	61,15,000.00 एकसत्ठी लाख पन्द्र हजार	थप- 4,75,000.00 88.38%
वडा नं ३ को वडा / पालिका को कार्यसम्पन्न भयको रकम रु	36,44,000.00 छत्तिस लाख चौवालिस हजार	59.59%%
वडा नं ३ तर्फ को जम्मा रकम रु	5,000,000.00 पचास लाख	जम्मा -69,19,000.00 उन्नन सत्तरिलाख उन्नाइस हजार
वडा नं ३ मा पालिका तर्फको जम्मा रकम	1,919,000.00 उन्नाइस लाख उन्नाइस हजार	

योजना को भौतिक प्रगति - वडा नं ३

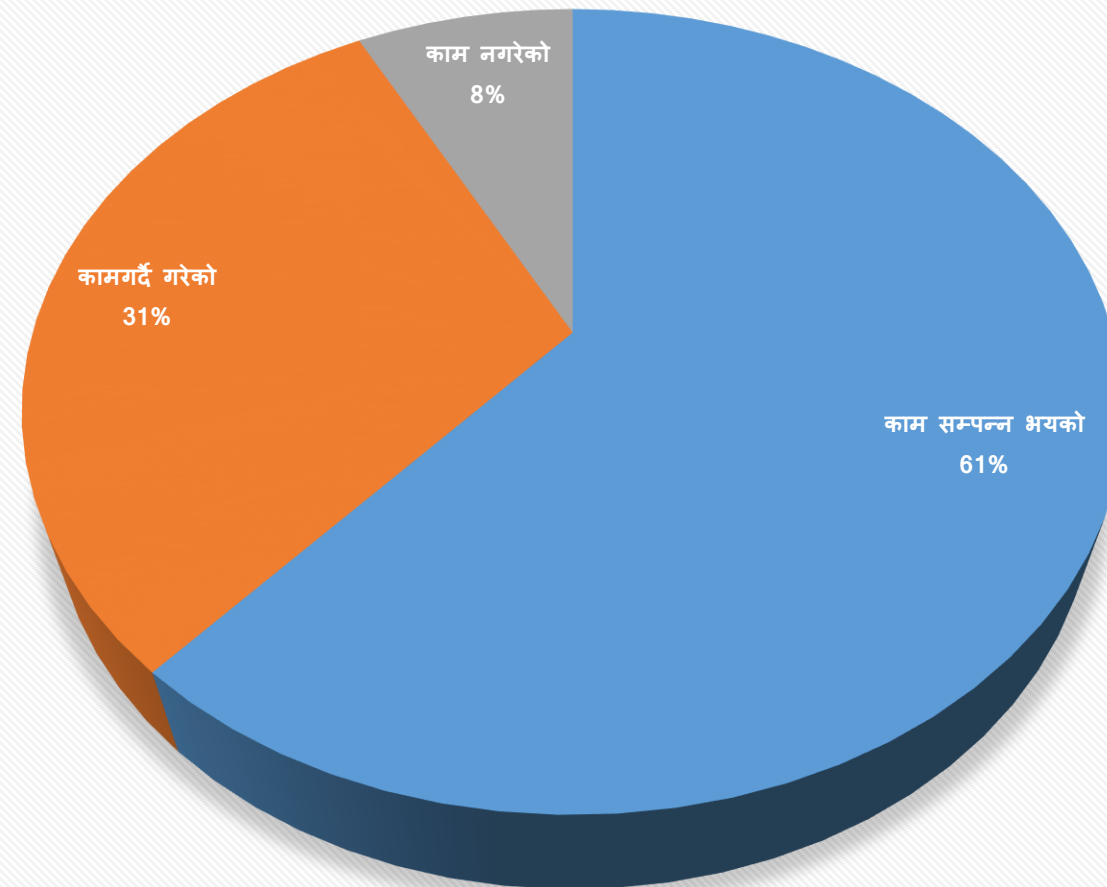

■ काम सम्पन्न भयोको ■ काम गर्दै गरेको ■ काम नगरेको


वडा नं. ४ को योजना विवरण

वडा नं ४ को योजना संख्या अनुसारको विवरण					
योजना विवरण	संख्या	प्रतिसत	कैफियत		
जम्मा योजना	24				
इस्टिमेट सम्झौता योजना	22 थप -1	91.67%			
काम सम्पन्न भयको	12, थप -1	50%			
काम हुदै गरेको योजना	10 थप -3	41.67%			
सम्झौता गरि काम नगरेको	2		काम गर्न अटेर गरेको		
सम्झौता नगरेको योजना	0 पहिला -2				
वडा तर्फको जम्मा योजना	14				
वडा नं ४ मा पालिका तर्फको जम्मा योजना	10				

रकम अनुसारको विवरण

विवरण	रकम	थप प्रगति/प्रतिसत
वडा नं ४ को वडा / पालिका को जम्मा रकम रु	9,875,000.00 अन्ठानब्बे लाख पचहत्तरहजार	
वडा नं ४ को वडा/ पालिका को सम्झौता भयको रकम रु	9,525,000.00 पन्चानब्बे लाख पच्चिस हजार	96.46%
वडा नं ४ को वडा / पालिका को कार्यसम्पन्न भयको रकम रु	40,25,000.00 चालिस लाख पच्चिस हजार	थप -7,00,000 40.76%
वडा नं ४ तर्फ को जम्मा रकम रु	5,000,000.00 पचास लाख	जम्मा -98,75,000.00 अन्ठानब्बे लाख पचहत्तरहजार
वडा नं ४ मा पालिका तर्फको जम्मा रकम	4,875,000.00 अड्चालिस लाख पचहत्तर हजार	

योजना को भौतिक प्रगति - वडा नं ४

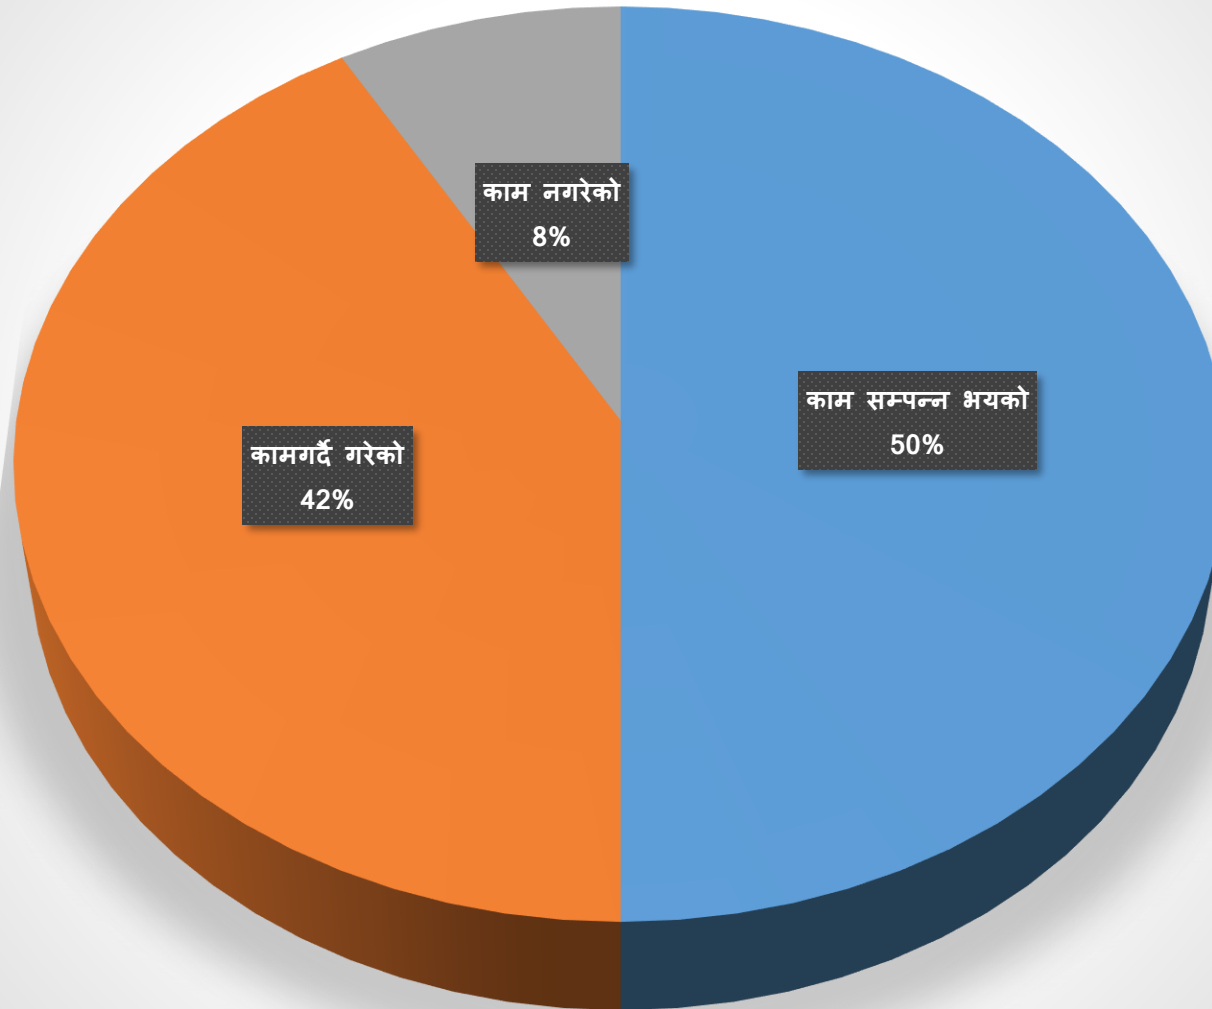

वडा न. ५ को योजना विवरण


वडा नं ५ को योजना संख्या अनुसारको विवरण

योजना विवरण	संख्या	प्रतिसत	कैफियत		
जम्मा योजना	26				
इस्टिमेट सम्झौता योजना	25	96.15%			
काम सम्पन्न भयको	24	92.31%			
काम हुदै गरेको योजना	0				
सम्झौता गरि काम नगरेको योजना	1	3.85 %	आन्तरिक स्रोतको कारण रोक्किको काम नगर्ने		
सम्झौता नगरेको योजना	1	3.85 %			
वार्ड तर्फको जम्मा योजना	13				
वडा तर्फको सम्झौता नगरेको योजना	0				
वडा तर्फको सम्झौता गरि काम नगरेको योजना	0				
वडा नं ५ मा पालिका तर्फको जम्मा योजना	14				
वडा नं ५ मा पालिका तर्फको सम्झौता नगरेको योजना	1				
वडा नं ५ मा पालिका तर्फको सम्झौता गरि काम नगरेको योजना	1				
प्रदेश तर्फको योजना	1	100.00%	कार्य सम्पन्न		

रकम अनुसारको विवरण


विवरण	रकम	प्रतिसत
वडा नं ५ को वडा / पालिका को जम्मा रकम रु	11,500,000.00 एक करोड पन्द्र लाख	
वडा नं ५ को वडा / पालिका को सम्झौता भयको रकम रु	10,800,000.00 एक करोड आठ लाख	93.04%
वडा नं ५ को वडा / पालिका को कार्यसम्पन्न भयको रकम रु	1,08,00,000.00 एक करोड आठ लाख	93.04 %
वडा नं ५ तर्फ को जम्मा रकम रु	5,000,000.00 पचास लाख	जम्मा -1,40,00,000.00 (एक करोड चालिसलाख)
वडा नं ५ मा पालिका तर्फको जम्मा रकम	6,500,000.00 पैंसठ्ठी लाख	
प्रदेश तर्फको जम्मा रकम	2,500,000.00 पच्चिस लाख	

योजना को भौतिक प्रगति - वडा नं ५

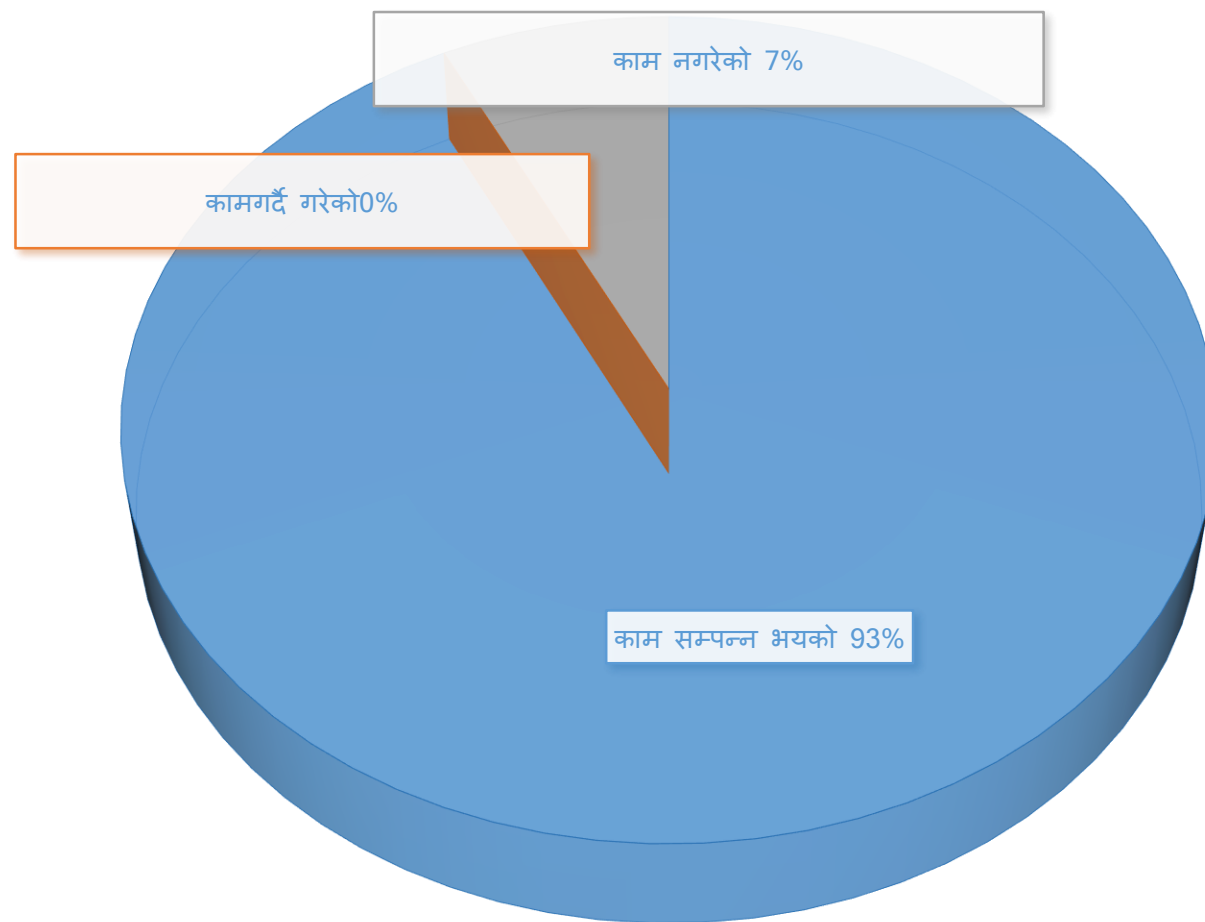


गाउँपालिका भरिको सम्पन्न योजनाको अवस्था

वित्तीय अवस्था%

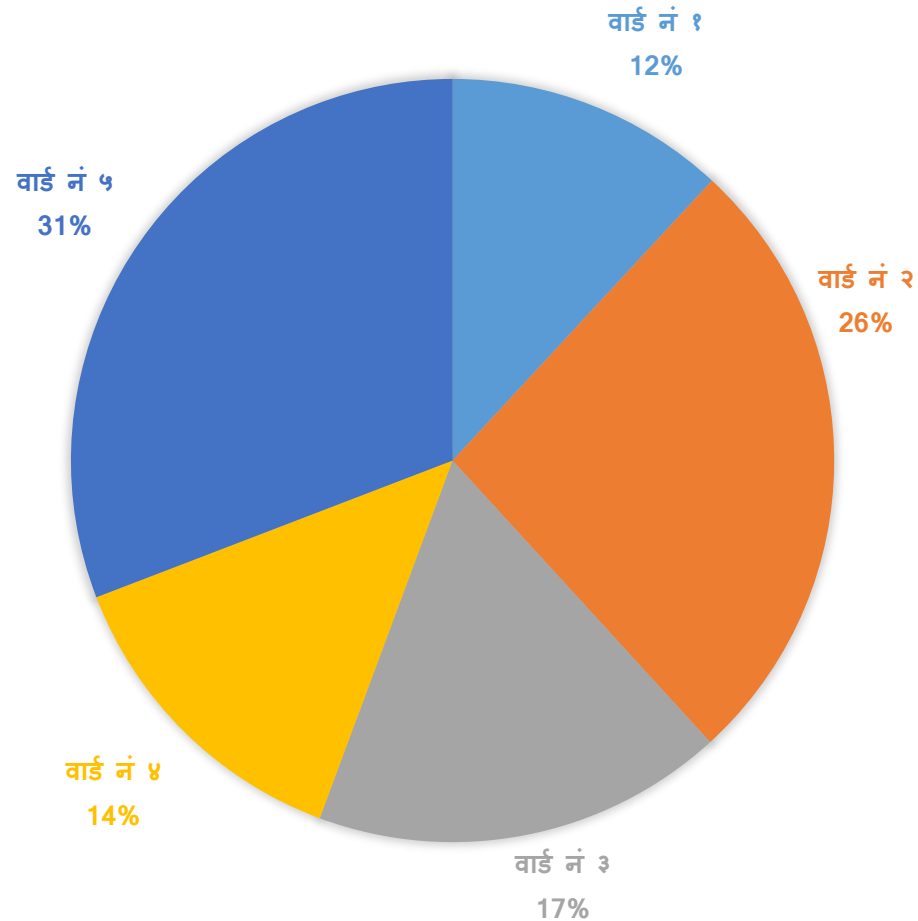

भौतिक अवस्था%

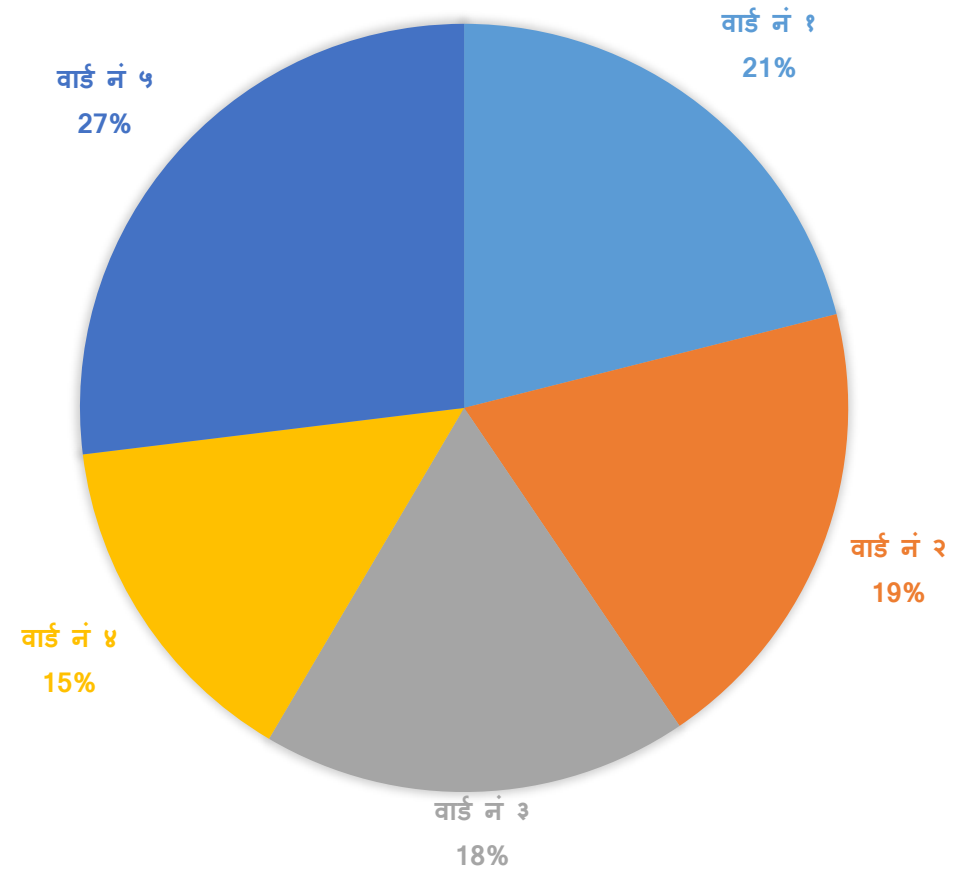

पूर्वाधार शाखा अन्तर्गत आ.वा.२०७९/०८० मा हाल सम्म सम्पन्न भयका विकास योजना

वडा नं	नयाँ सडक (मिटर)	भवन तथा सतल (संख्या)	खेल मैदान (संख्या)	कृषि कुलो (संख्या)	खानेपानी (संख्या)	अन्य – मन्दिर,सौचालय,तार जाली,पुल,घेराबेरा (संख्या)
वडा नं १	1028 m	1	0	1	2	1
वडा नं २	800 m	2	0	2	1	4
वडा नं ३	1460 m	1	0	1	0	5
वडा नं ४	1087 m	1	0	1	0	3
वडा नं ५	4095 m	2	2	0	3	5

पूर्वाधार शाखामा भयका थप नयाँ काम

- योजनामा इस्टिमेट सहित Design Drawing
- योजना भुक्तानी कागज पत्र मा पारदर्शिता
- प्रतेक वडा मा योजना अभिलेख प्रगति सहित
- कन्टेन्जेन्सी खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण

कार्य सम्पादन गर्न आइपरेका समस्या

- प्राविधिकलाइ ल्यापटप को कमि
- कार्यसम्बन्धि तालिमको कमि
- सवारी साधन मा समस्या तथा मर्मत खर्च कमि
- फोन नेटवर्क मा समस्या
- सुरक्षा सामाग्री (बुट,रेनकोट,Safety Leg Pad) ल्याउने प्रक्रिया
- कार्य सम्पादनका सामाग्री को कमि (Tape,Abni Level,GPS)
- पूर्वाधार शाखा मा Internet नभएको
- कार्यालय सहयोगीको सहयोग कम
- कार्यक्ष साँघुरो र झ्यालको सिसा फुटेको हुनाले पानि भित्र आउने
- वडा प्राविधिक लाइ केहि समय कार्यालय को काम गा.पा. बाट गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने
- इन्धन को कमि

कार्य सम्पादन गर्न आइपरेका चुनौती

- भाषाको सम्बन्धि
- भुगोल सम्बन्धि
- कच्ची सडकको अवस्था
- मोटर साइकलको अवस्था
- कर्मचारी समन्वयको कमि

काम गर्ने क्रममा लिइएका केहि कामका तथा अन्य तस्विरहरु



सिन्धुली र काभ्रे सिमाना मा गेट



अनुगमन तथा नापजाँच



सात दोबाटोमा सोलिंग,वाल र जाली को कार्य सम्पन्न



सडक नापजाँच गर्दै




सडक र नालाको अवस्था



योजना स्थल मा नापजाँच तथा अनुगमन गर्न जाँदै



अनुगमन गर्दै हिंड्दा बाटो मा अइसेलु

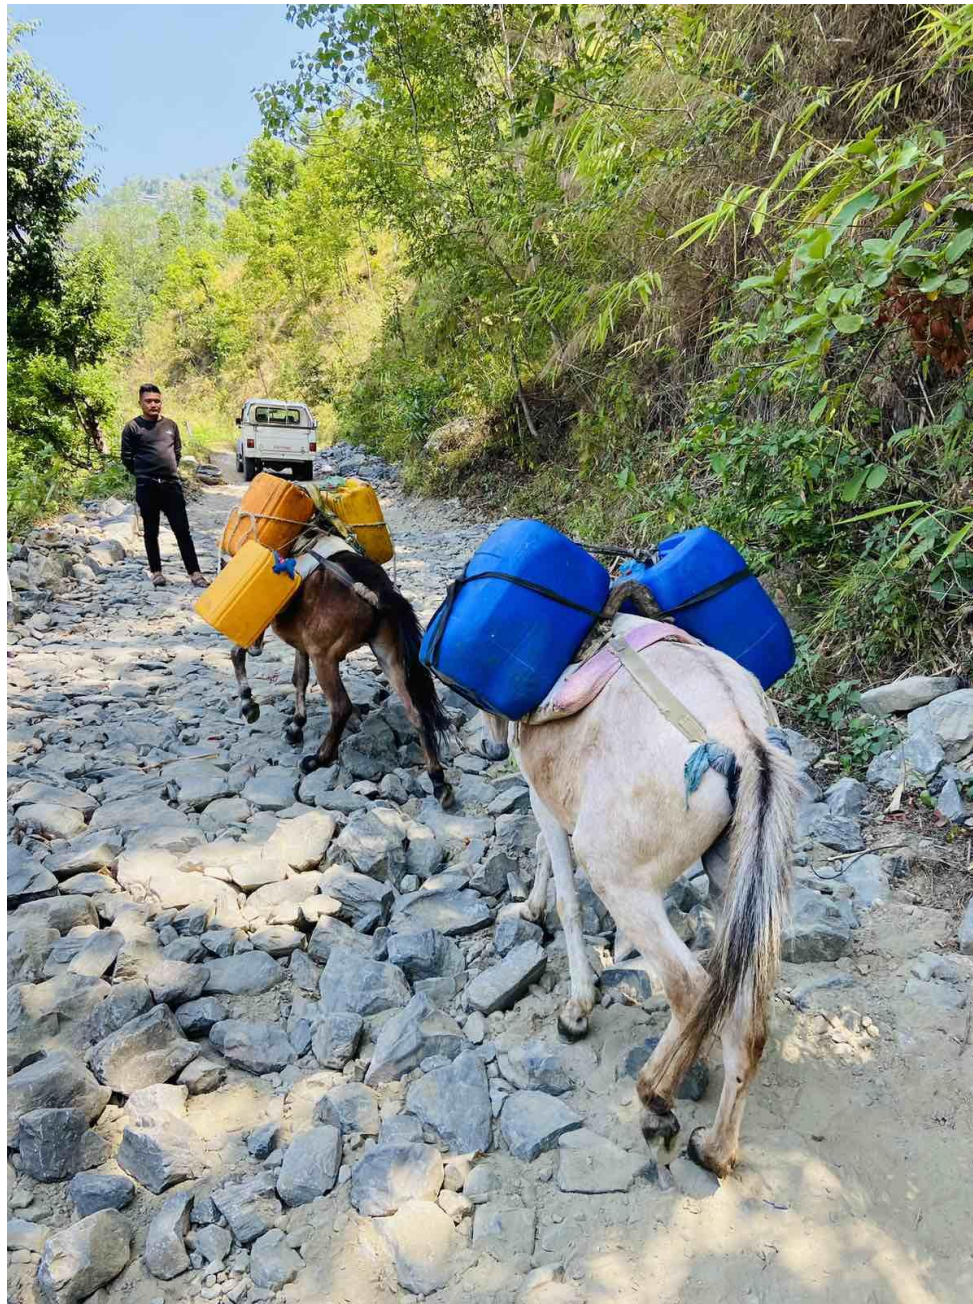

सडक भैकन पनि सामान बोक्न गधाको प्रयोग



वडा नं. १ मा अनुगमन गर्दै हिड्ने क्रममा



कर्मचारी र जनप्रतिनिधि रोड नाप्दै



वार्सादको समयमा रोडको अवस्था



रोडको सबै गर्न मोटरसाइकल बाट जाने बाटोको अवस्था



फिल्ड हिंडने क्रममा मोटरसाइकलबिग्रिने समस्या



थोरै लगानीमा भयका उत्कृष्ट केहि कामहरु



थोरै लगानीमा भयका उत्कृष्ट केहि कामहरु



चन्दनपुर सातदोबाटो सडक निर्माण प्रगति



असुरक्षित काम र यात्रा



रामपुर बजार

मेरो प्रस्तुती हेरी र सुनिदिनु भयको मा यहाँहरु सम्पूर्णमा हार्दिक

धन्यवाद !!!!

पूर्वाधार शाखा

