



घ्याङलेख गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

हायुटार, सिन्धुली
वागमती नदी
हायुटार, सिन्धुली
वागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३



प.सं. :- ०७९/०८०

च.नं. :- १९१३

मिति :- २०८०/०३/२७

विषय :- बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,

योजना शाखा, सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिका अर्न्तगत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फको बार्षिक प्रगति विवरण पाना १२ यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

२५
१९/३/८०
राम कुमार काकी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
राम कुमार काकी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ


श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, नेपाल ।

श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, नेपाल ।


श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सिन्धुली ।



घ्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली



पूर्वाधार शाखा वार्षिक प्रतिवेदन
आ.वा. - २०७९/०८०



पूर्वाधार शाखा
मुकेश पूर्वी - इन्जिनियर
सुदन कुमार श्रेष्ठ - अ. सव-इन्जिनियर

मिति - २०८०/०३/२५



परिचय :-

नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरूको पुनःसंरचनाको लागि गठन गरेको उच्च स्तरीय आयोगले २०७३ पुष २२ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले परिमार्जन गरि २०७३ फागुन २७ गतेबाट स्थानीय तह लागु गर्ने निर्णय गरे अनुसार साविकको मध्यमान्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत जनकपुर अन्चलको मध्य भागमा अवस्थित सिन्धुली जिल्लाको ५० वटा साविकको गा.वि.स. हर मध्य साविकका गा.वि.स. हर आमले,वस्तिपुर,तामाजोर,नेत्रकाली,र शान्तेश्वरी,गा.वि.स. हरलाई समायोजन गरि घ्याङलेख गाउँपालिका गठन गरिएको हो। संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप ७ प्रदेशमा विभाजित नेपालको साविक प्रदेश नं ३ मा अवस्थित सिन्धुली जिल्लाको पश्चिमउत्तरमा घ्याङलेख गाउँपालिका पर्दछ। सिन्धुली जिल्लामा रहेको ९ वटा स्थानीय तह मध्ये २ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका हरु रहेका छन। घ्याङलेख गाउँपालिकाको कार्यालय सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली बजारबाट ३५ कि.मि. र सिन्धुली जिल्ला हुँदै जाने वि.पी. राजमार्गको पिपल भन्ज्याङबाट २३ कि.मि. को दुरीमा अवस्थित रहेको छ।

गाउँपालिकाले विकास स्थापनाकाल देखि नै निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिदै आइरहेको छ,उक्त विकास निर्माण कार्य आ.व. २०७९/८० मा विभिन्न थरीका कामहरु सम्पन्न भयो भनी कुनै कामहरु क्रमागत पनि रहेका छन,यस आर्थिक वर्समा पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सिंचाई,सडक,भवन तथा नक्सा अभिलेखीकरण,नियमित,तथा नक्सा पास र ठेक्का सम्बन्धि महत्वपूर्ण कार्यहरु भयको छ।

पूर्वाधार शाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरु :-

सि.नं	नाम	पद	कार्य स्थल	मो.नं
१	मुकेश पुर्वे	इन्जिनियर	पालिकाभरी	९८६२९९२६०५
२	शम्भु बहादुर योन्जन	सव- इन्जिनियर	पालिकाभरी-भवन शाखा	९८६३५४४८८४
३	मिलन पुलामी	सव- इन्जिनियर	पालिकाभरी+वडा २	९८४३१०४४८९
४	सुदन कुमार श्रेष्ठ	अ.सव- इन्जिनियर	पालिकाभरी	९८६५१८५८७४
५	निराजान राना	अ.सव- इन्जिनियर	वडा-५	९८४९६५४६०४
६	अस्मिता थिंड	अ.सव- इन्जिनियर	वडा-३	९८६४१४०४३२
७	छत्र बहादुर श्रेष्ठ	अ.सव- इन्जिनियर	वडा-१	९८४८७८४९०२
८	शंखब्धज लामा	अ.सव- इन्जिनियर	वडा-४	९८४५८४५२१४

[Signature]

[Signature]

[Signature]
मुकेश पुर्वे
इन्जिनियर

[Signature]
राम कुमार काकी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत २



१. घ्याडलेख गाउँपालिका अन्तर्गत संचालन भएका ठेक्काहरू

यस आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संचालन भएका ठेक्का र गत वर्ष संचालन भइ यस आ.व मा ०८०/२०७९ सम्पन्न भएका योजनाहरू तपसिल बमोजिम रहेका छन ।

१.१ गत आ.वा. मा संचालन भइ यस आ.व. २०७९/०८० सम्पन्न भएका योजनाहरू :-

सी.नं	ठेक्का विवरण	ठेक्का नं	सम्झौता रकम	भुक्तानी रकम	कैफियत
१	रामपुर पाखुरे रामभेडे हुँदै काकलिङ सम्म सडक निर्माण	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/4/078/079	९०,३७,९५३.५०	८७,४८,४५६.९२	
२	Ward no 5 Office Building Construction (Multi-Year)	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/5/077/078	४२,५०,५९९.२३	३९,९३,०३१.२५	
३	सोला भन्ज्यांग चिलाउने सातदोबाटो सडक स्तरउन्नति	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/3/078/079	८४,०८,७४७.८६	८४,०८,७४७.८६	
४	आमाले थालागाउँ सडक स्तरउन्नति	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/01/078/079	९२,०१,८१०.२९	९२,०१,८१०.२९	

१.२ यस आ.व. २०७९/०८० मा संचालन भएका सम्पन्न र क्रमागत योजनाहरू :-

सी.नं	ठेक्का विवरण	ठेक्का नं	सम्झौता रकम	भुक्तानी रकम	कैफियत
१	चन्दनपुर-सल्ले-केराबारी-गैरी-भैसे-वस्तीपुर-सातदोबाटो सम्म सडक निर्माण	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/02/079-80	१,९१,२९,७७२.०५	१,९१,२७,३०१.१२	सम्पन्न भएका योजना (समपुरक योजना)
२	माटोखानी झोलुङ्गे पुल निर्माण	GHRM/Sindhuli/Goods/NCB/8/078/079	२८,९५,३५७.३९	२२,५५,०००.००	क्रमागत योजना
३	Construction of Administrative Building	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/12/078/079	५,७७,८९,०३७.१३	१,००,००,०००.००	क्रमागत योजना मोविलाईजेसन
४	Construction of Safe House Building	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/6/078/079	३८,९०,४६९.०६	३१,४०,४६९.०६	क्रमागत योजना
५	फापरचुली भ्युड टावर निर्माण	GHRM/Sindhuli/Works/NCB/02/076/077	१,१७,३४,१२९.४८	कार्य सम्पन्न भएपछि रु ७२,००,०००.०० दिनुपर्ने तर कार्य नभएको	

[Signature]

[Signature]
मुकेश पुर्वे
इन्जिनियर

[Signature]
३
राम कुमार काकी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



३. यस आ.व. वर्ष विनियोजित योजनाहरूको विवरणहरू :-

सी.नं	विवरण	योजना संख्या	विनियोजित रकम	सम्पन्न योजना संख्या	खुद भुक्तानी रकम	काम नगरेको योजना	काम नगरेको रकम
१	पालिका स्तरीय	३२	६,५९,९६,०००.००	२२	५,९६,६६,०००.००	१०	६२,५०,०००.००
२	वडा नं १	१०	४४,००,०००.००	१०	३६,३७,०००.००	-	-
३	वडा नं २	११	४३,५०,०००.००	११	४१,३५,०००.००	-	-
४	वडा नं ३	२१	४२,९४,०००.००	२१	३८,७२,०००.००	-	-
५	वडा नं ४	१५	४४,००,०००.००	१५	४१,२४,०००.००	-	-
६	वडा नं ५	१४	५०,००,०००.००	१४	४९,१४,०००.००	-	-
	जम्मा-	१०३	८,८३,६०,०००.००	९३	८,२१,१०,०००.००	१०	६२,५०,०००.००
	प्रतिशत			९०.२९%	९२.९२%	९.७१%	७.०८%

३. यस आ.व. वर्ष प्रदेश अन्तर्गत पालिकाद्वारा संचालित योजनाहरूको विवरणहरू :-

सी.नं	विवरण	योजना संख्या	विनियोजित रकम	सम्पन्न योजना संख्या	खुद भुक्तानी रकम	काम नगरेको योजना	काम नगरेको रकम
२	वडा नं १	१	५०,००,०००.००	१	४४,८८,०००.००	-	-
३	वडा नं २	३	१,००,००,०००.००	२	७२,४८,०००.००	१	२५,००,०००.००
६	वडा नं ५	१	२५,००,०००.००	१	२४,७४,०००.००	-	-
	जम्मा-	५	१,७५,००,०००.००	४	१,४२,१९,०००.००	१	२५,००,०००.००
	प्रतिशत			८०%	८१.२०%	२०%	१४.८०%

[Signature]

[Signature]

[Signature]



४. आ.वा. २०७९/८० मा भएका विकास निर्माण कार्यको परिणाम :-

वडा नं	नयाँ सडक मि.	सडक स्तरउन्नति तथा सरसफाई मि.	भवन	सिंचाई कुलो	खानेपानी	अन्य
१	१२७५	२५००	२	१	२	६
२	८००	२२००	३	२	१	११
३	२२३५	२१००	३	२	२	१२
४	११५७	५४५०	२	२	३	७
५	४०९५	६५५०	२	०	३	५
जम्मा -	९५६२	१८८००	१२	७	११	४०

५. कार्य मूल्यांकन तथा अनुगमन

घ्याडलेख गाउँपालिका भौगोलिक वनावट अनुसार बिकट भूगोल मानिन्छ। उक्त भूगोल मा विकास निर्माणको काम गर्न त्यसै चुनौतिपूर्ण छ । यस भूगोलमा विकास निर्माणको काम गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ढुंगा केहि सजिलै उपलब्ध भए पनि सिमेन्ट, रड, गिट्टी, बालुवा जस्ता अन्य निर्माण सामग्री नपाइने हुँदा सिन्धुली, बनेपा, नेपालथोक बाट ढुवानी गरी ल्याउदा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने काम कम हुने र वर्षातको कारण ढुवानी गर्न कठिनाईको बावजुत पनि हामीले यस चालु आ.व. २०७९/०८० मा ९३.५२% भौतिक र ९२.१४% वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएका छौं ।

उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदार द्वारा गराइएको सम्पूर्ण कामहरु प्रतक्ष निर्माण स्थल गइ इस्टिमेट तथा नापी गरी मूल्यांकन गरिएको छ । उक्त मूल्यांकनमा गुणस्तरहिन कामहरुको नापी नगरी परिणाम घटाई मूल्यांकन भुक्तानी गरिएको छ, प्रत्येक वडामा वडा प्राविधिक हरू रही सम्बन्धित सम्पूर्ण प्राविधिक कार्यहरु पूर्ण रुपमा सम्पन्न गरिएको छन । अनुगमन गर्ने क्रममा कुनै पनि कुरामा प्रभावित नभई प्रभावकारी रुपले अनुगमन गरी पूर्वाधार शाखा को सम्पूर्ण कार्य जिम्मेवारी पुरा गरी स्वच्छ र पारदर्शी ढंगबाट कार्य मूल्यांकन तथा अनुगमन गरी भुक्तानी भयोको छ ।

६. कार्यसम्पदन गर्दा आइपरेका समस्या तथा चनौतीहरु :-

आ.व. २०७९/०८० मा घ्याडलेख गाउँपालिका मा विकास निर्माण कार्य गर्दै गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या तथा चनौती हरूका बावजुद पनि कार्य सम्पदनमा कमी कमजोरी नगरी सम्पन्न गरियो, उक्त सम्पदान मा देखियका वा भोगिएका समस्याहरु निम्न छन :-

- ❖ भौगोलिक विकटताका कारण आवत जावत गर्न सवारी साधनमा समस्या ।
- ❖ समयमा कार्य सम्पदान गर्न स्रोत साधनको कमि ।
- ❖ अनुगमन कार्यमा कार्यालय बाट आवश्यक ब्यवस्थापन मा कमि ।
- ❖ अनुगमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रक्रिया मा समन्वयको कमि हुनु ।
- ❖ अनुगमन संग जोडीएको पदाधिकारी र कर्मचारी ले उचित समय दिन नसक्नु ।
- ❖ यस गा.पा. मा तामाङ्ग समुदाय धेरै भयोले अन्य समुदायका कर्मचारीसंग कार्य गर्न भाषाको कारण कठिनाई हुनु ।
- ❖ प्राविधिक कर्मचारी ले कार्यालय र फिल्ड दुवै काम गर्नु पर्ने भएकोले सेवा सुविधा को कमि हुनु ।
- ❖ प्राविधिक कर्मचारी हरूलाई स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्ने वातावरणको कमी हुनु ।
- ❖ प्राविधिक कर्मचारीहरुले गरेका कार्यहरु वास्तविक कामकुरा नबुजी हल्लाको भरमा अनावश्यक आरोप लगाउने परम्परा ।
- ❖ कार्यसम्पदान प्रति सीप तथा तालिमको व्यवस्थापन को कमि हुनु ।

[Signature]

[Signature]

[Signature]


मुकेश पुर्वे
नियन्त्रक

[Signature]
राम कुमार कार्की
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

७. कार्यसम्पदान गर्दा लिइएका केहि तस्विर हरु




कार्थे सिन्धुली सिमाना

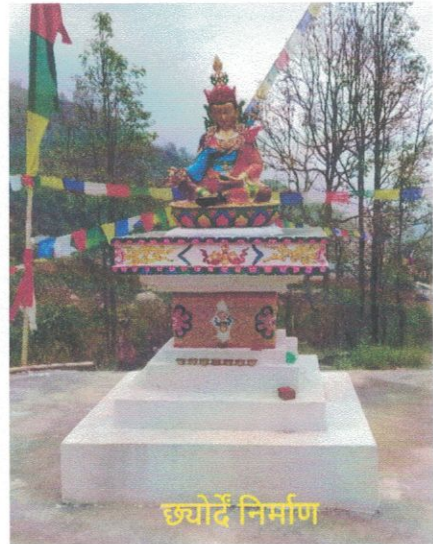


छ्योर्दे निर्माण




धारा निर्माण

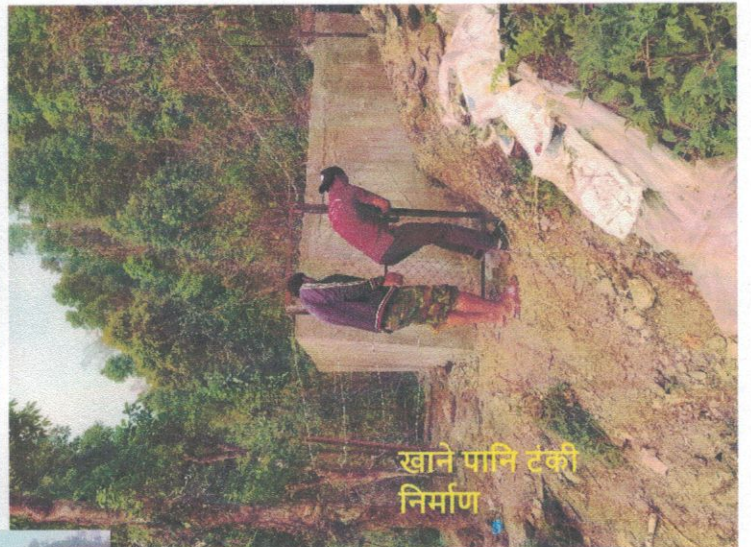

खाने पानि टंकी
निर्माण

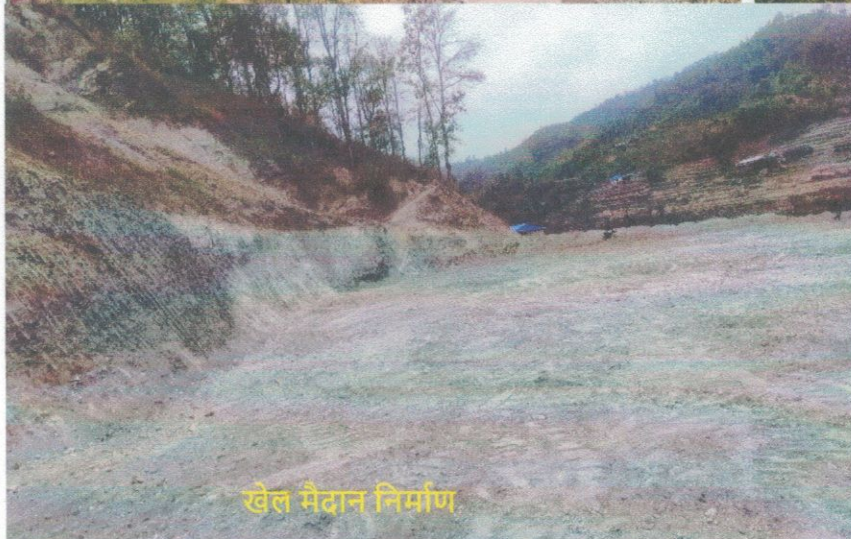

खेल मैदान निर्माण



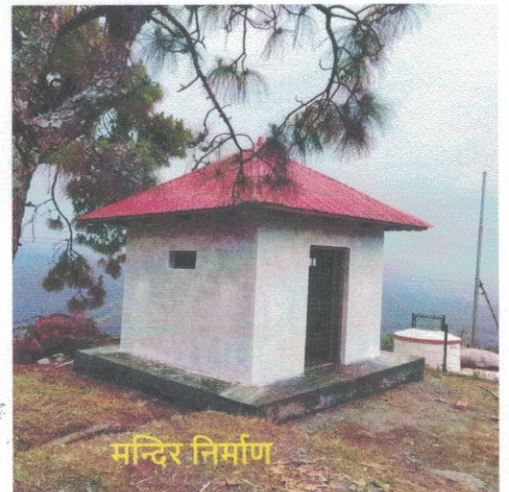


मन्दिर निर्माण

[Signature]

[Signature]


[Signature]
मुकेश पुर्वे
प्रमुखियर

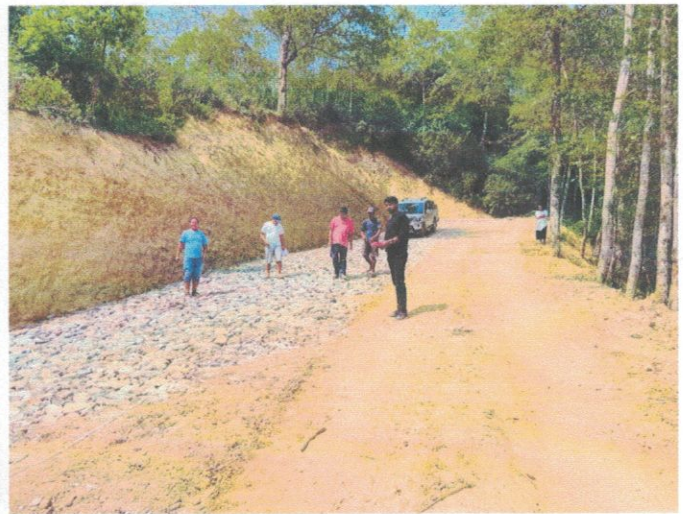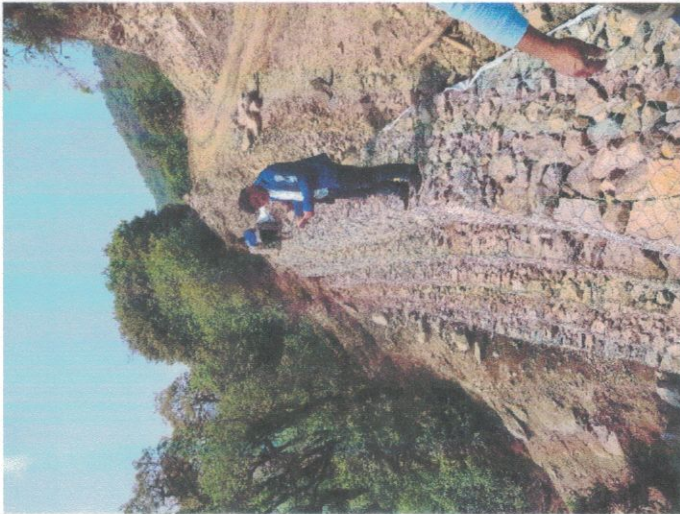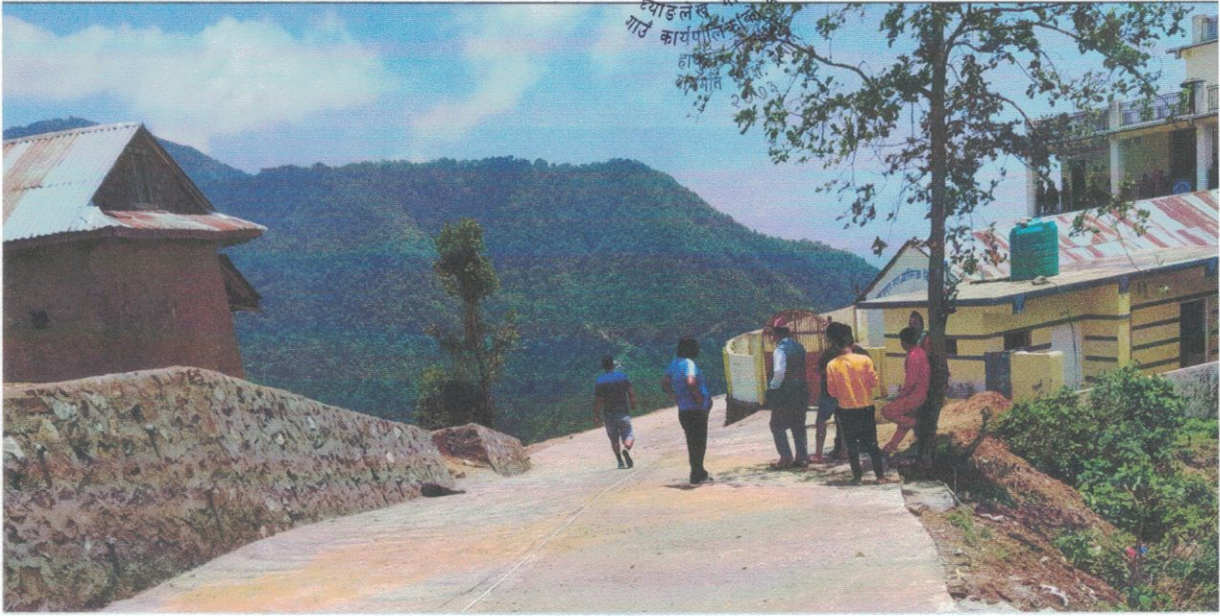

चन्दनपुर सात दोबाटो सडक निर्माण - ठेक्का



जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन

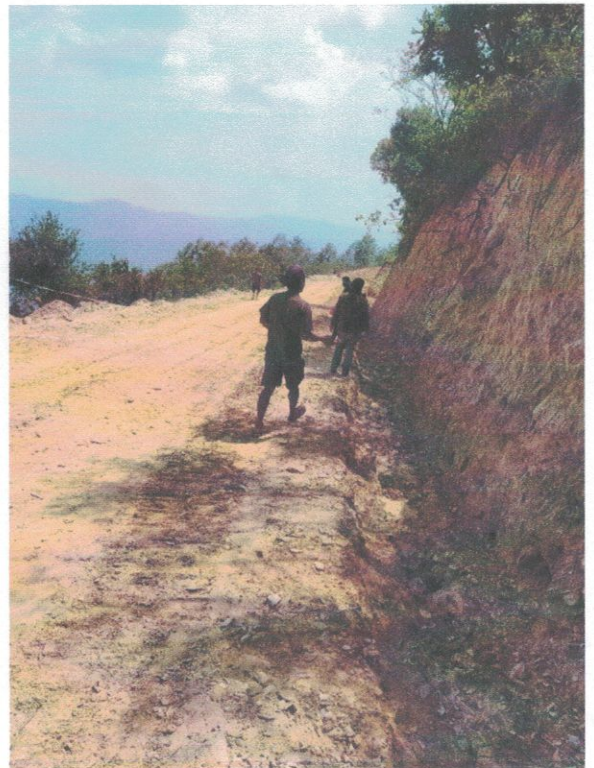

[Signature]

[Signature]

[Signature]
सुदेश पुर्वे
निर्देश



वडा नं ५ वडा कार्यालय निर्माण ठेक्का



[Signature]

[Signature]

[Signature]
मुकेश पुर्वे
इन्जिनियर



रामपुर कागलिंग सडक निर्माण- ठेक्का

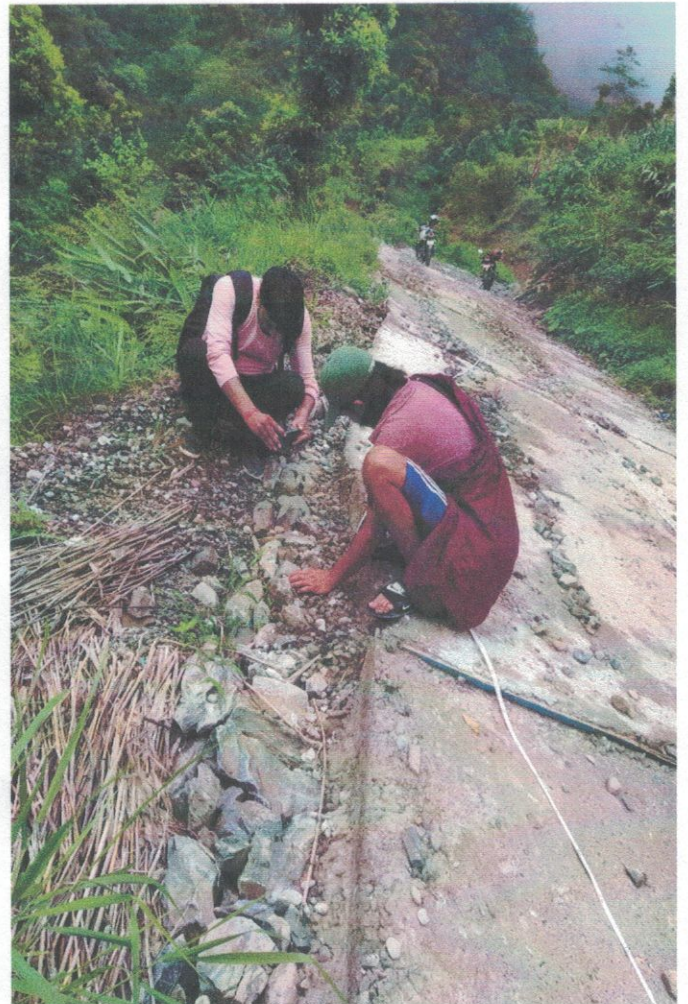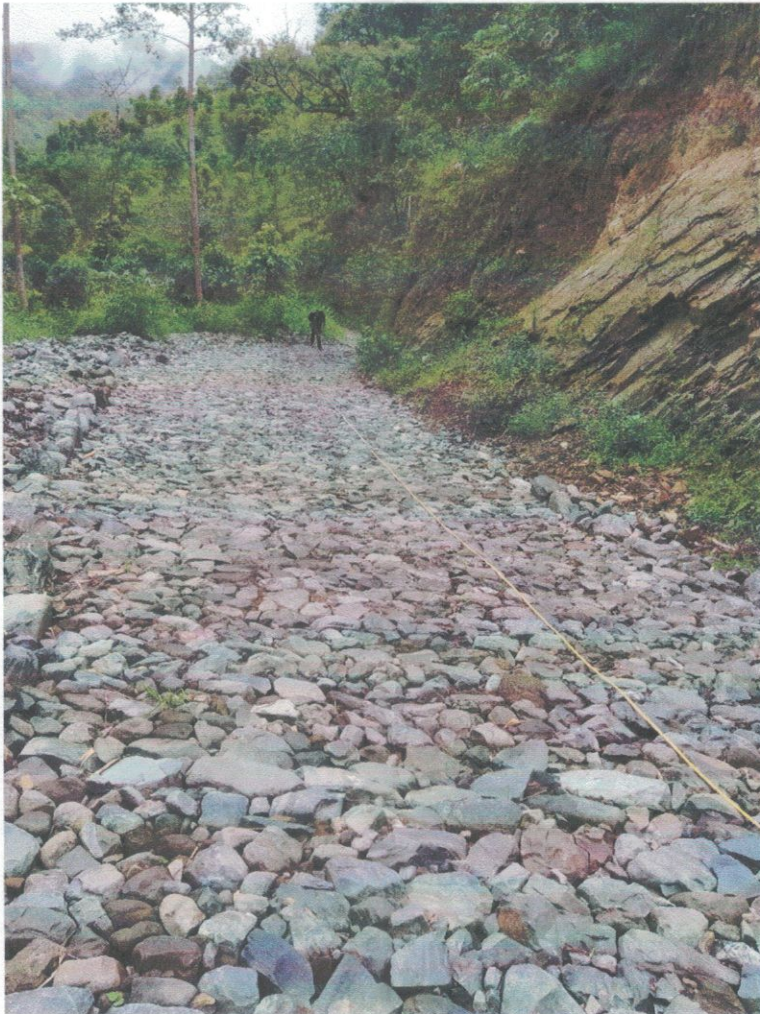





 मुकेश पुरी
 इन्जिनियर




गाउँपालिका भवन निर्माण कार्य



जिल्ला समन्वय समितिबाट

Handwritten signature: K. J. 2073

Handwritten signature: मुकेश पुर्वे
इन्जिनियर

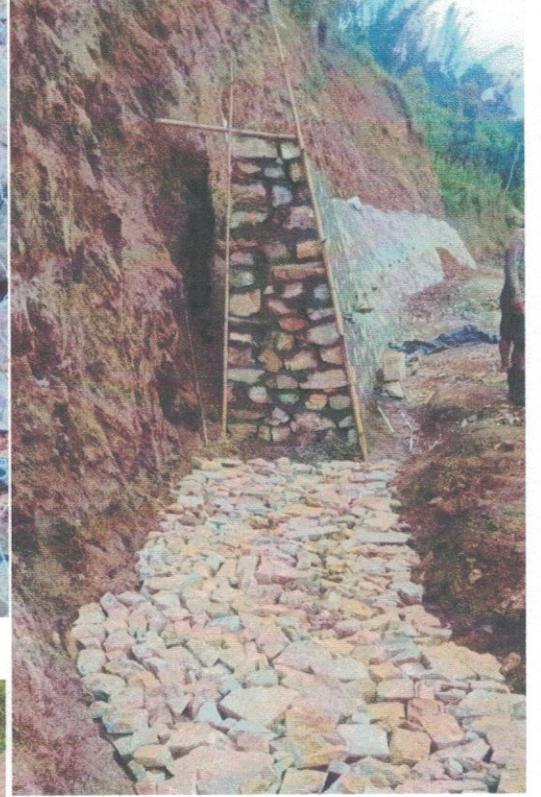

चन्दनपुर सात दोबाटो
सडक निर्माण - समिति



जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन

[Signature]

[Signature]


 मुकेश पुरी
 इन्जिनियर



थामी संग्रालय निर्माण -समिति

Handwritten signature and text.

Handwritten signature and text: मुकेश पुर्वे इन्जिनियर
